

BOOKEAT

Τεχνολογία Λογισμικού

BookEAT

Team Plan v-1.0

Μέλη Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου	Έτος σπουδών
Παναγιώτα-Αλεξάνδρα Τρίχα	1072486	5°
Δημήτριος Μπαρούτης	1084549	4°
Κωνσταντίνος Τσιλιγιάννης	1084642	4°
Κωνσταντίνος - Μάριος Καπλάνης	1080447	5°

Υπεύθυνοι Παρόντος Τεχνικού Κειμένου:

Κωνσταντίνος - Μάριος Καπλάνης Editor

Κωνσταντίνος Τσιλιγιάννης Contributor Δημήτριος Μπαρούτης Contributor

Παναγιώτα - Αλεξάνδρα Τρίχα Editor

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Για την δημιουργία των τεχνικού κειμένου χρησιμοποιούμε το Google Docs. Για την δημιουργία των διαγραμμάτων Gantt χρησιμοποιήσαμε το Instagantt.

Για την δημιουργία των διαγραμμάτων Pert χρησιμοποιήσαμε το <u>Visual</u> <u>Paradigm</u>.

Για την δημιουργία του logo χρησιμοποιήσαμε το Design Al Logo Generator.

Για την δημιουργία των MockUp Screens χρησιμοποιήσαμε το Figma.

Για το use case diagram χρησιμοποιούμε το <u>SmartDraw</u>.

Για την δημιουργία του domain model diagram χρησιμοποιήσαμε το Figma.

Για το BookEat θα χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα python.

Για την ανάπτυξη του κώδικα θα χρησιμοποιήσουμε το Visual Studio Code.

Περιεχόμενα

Μέθοδος Εργασίας	4
Χρονοπρογραμματισμός project	5
Εργαλεία Χρήσης	6
Project- Pert Chart	7
Project- Gantt Chart	9

→ Αλλαγές που κάναμε από την τελευταία έκδοση

Σε αυτήν την έκδοση (τελική) έχουμε προσθέσει στην τελευταία σελίδα ένα κείμενο που εξηγούμε την λειτουργία της ομάδας εν τέλη και κατά πόσο κινηθήκαμε βάση τον εκτιμήσεων μας.

Μέθοδος Εργασίας

Σε συνάντηση όλης της ομάδας, συμφωνήσαμε ότι το πιο κατάλληλο μοντέλο για την επιτυχή λειτουργία μας είναι αυτό της Kanban. Εφαρμόσαμε αυτό το μοντέλο βάση των απαιτήσεων της εργασίας που έχουμε εμείς να υλοποιήσουμε στα πλαίσια του μαθήματος, η οποία δεν απαιτεί την αντίστοιχη δουλειά όπως μια ομάδας σε μια επιχείρηση, για παράδειγμα.

Στόχος μας με την Kanban είναι η διαφάνεια όλων των διαδικασιών της εργασίας και η παράλληλη και ισάξια δουλειά/ανάμειξη όλης της ομάδας στο project, ώστε να αποκτήσουμε όλοι την ίδια εμπειρία από το project και να παρακολουθούμε την διαδικασία όσο εξελίσσεται.

Σε αυτά τα πλαίσια, οργανώσαμε ένα format δύο απαραίτητων συναντήσεων κάθε εβδομάδα που θα συμμετέχουμε όλοι, με την επιλογή περαιτέρω ομαδικών συναντήσεων σε περίπτωση που χρειαστεί. Σε κάθε συνάντηση επεξεργαζόμαστε τα ζητούμενα που έχουμε να καλύψουμε για την διεκπεραίωση του project και εργαζόμαστε παράλληλα σε διαφορετικά tasks ή ομαδικά σε αυτά που χρειάζεται η συμμετοχή όλης της ομάδας. Όλα τα μέλη θα ελέγχουν τα τεχνικά κείμενα πριν παραδοθούν.

Μέσω αυτής της μεθόδου θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα από το workload και θα φανεί ίσως πιο ξεκάθαρα μια καθυστέρηση που μπορεί να επιβαρύνει το συνολικό έργο.

Η ομάδα μας αποτελείται από ισάξια μέλη με ίδιες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες. Δεν θελήσαμε να ορίσουμε κάποιος να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο, όπως αυτός του project manager. Οπότε και τα 4 μέλη της ομάδας είναι team member.

Χρονοπρογραμματισμός project

Για τα χρονοδιαγράμματα του project επιλέξαμε τα tasks με γνώμονα τα περιεχόμενα κάθε παραδοτέου στο διάστημα του εξαμήνου.

Στους χρόνους που απεικονίζουμε έχουμε λάβει υπόψη και το βάρος εργασιών και της καθημερινότητας του κάθε ατόμου-μέλους που συμμετείχε στην υλοποίηση του project, ώστε να συγχρονιζόμαστε, και την συχνότητα με την οποία ήταν δυνατό να κάνουμε ομαδικές συναντήσεις. Η σειρά υλοποίησης των tasks προσπαθήσαμε να βασιστεί και στο πρόγραμμα με το οποίο διδάσκεται κάθε κομμάτι του παραδοτέου, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε το ζητούμενο καλύτερα πριν το εκτελέσουμε.Επεξεργαστήκαμε ποιά task θεωρούμε ότι αλληλοεξαρτώνται και με ποιά χρονική σειρά πρέπει να τα υλοποιήσουμε και τα απεικονίζουμε.

Επομένως, όπως φαίνεται στις εικόνες 1-4, τα tasks έχουν χωριστεί σε 4 κομμάτια τα οποία είναι τα 4 παραδοτέα του εξαμήνου. Έχουμε 3 milestones τα οποία είναι αντίστοιχα των ολοκληρωμένων παραδοτέων.

Στις εικόνες 1,2 και 3 φαίνεται το pert διάγραμμα για τον χρονοπρογραμματισμό του project και στην εικόνα 4 το αντίστοιχο gant διάγραμμα.

Εργαλεία Χρήσης

Τα εργαλεία που παραθέτουμε παρακάτω είναι μια πρώτη εκτίμηση των εργαλείων που συμφώνησε όλη η ομάδα να χρησιμοποιηθούν και στα οποία μπορεί να προστεθούν σε άλλο χρόνο κάποια ακόμη και θα αναφερθούν στα αντίστοιχα τεχνικά κείμενα που χρειάστηκαν. Αυτά που αναφέρουμε είναι κυρίως αυτά που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Για την δημιουργία των τεχνικού κειμένου χρησιμοποιούμε το Google Docs. Για την δημιουργία των διαγραμμάτων Gantt χρησιμοποιήσαμε το Instagantt.

Για την δημιουργία των διαγραμμάτων Pert χρησιμοποιήσαμε το <u>Visual Paradigm</u>.

Για την δημιουργία του logo χρησιμοποιήσαμε το <u>Design Al Logo Generator</u>. Για την δημιουργία των MockUp Screens χρησιμοποιήσαμε το <u>Figma</u>.

Για το use case diagram χρησιμοποιούμε το SmartDraw.


Για την δημιουργία του domain model diagram χρησιμοποιήσαμε το <u>Figma</u>. Για το BookEat θα χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα python.

Για την ανάπτυξη του κώδικα θα χρησιμοποιήσουμε το Visual Studio Code.


Project-Pert Chart



Εικόνα 1.



Εικόνα 2.

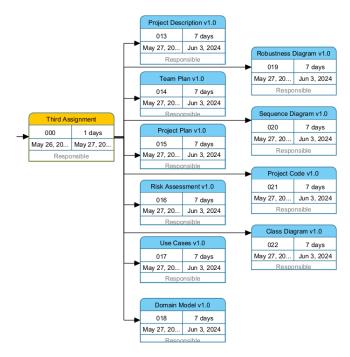


Εικόνα 3.

Το κρίσιμο μονοπάτι του pert διαγράμματος στις εικόνες 1,2,3 είναι η σειρά των υποέργων : ΤΥ1 - ΤΥ2 - ΤΥ4 - ΤΥ5 - ΤΥ6 - ΤΥ7 - ΤΥ8 - ΤΥ10 - ΤΥ12 - ΤΥ21

και η διάρκειά του είναι 83 ημέρες.

Στο τελευταίο σκέλος που τα υποέργα 13 εώς 22 διαρκούν τις ίδιες μέρες, θεωρούμε πως την μεγαλύτερη καθυστέρηση μπορεί να κάνει το υποέργο 21 το οποίο μπορεί να καθυστερήσει το project.

Project- Gantt Chart

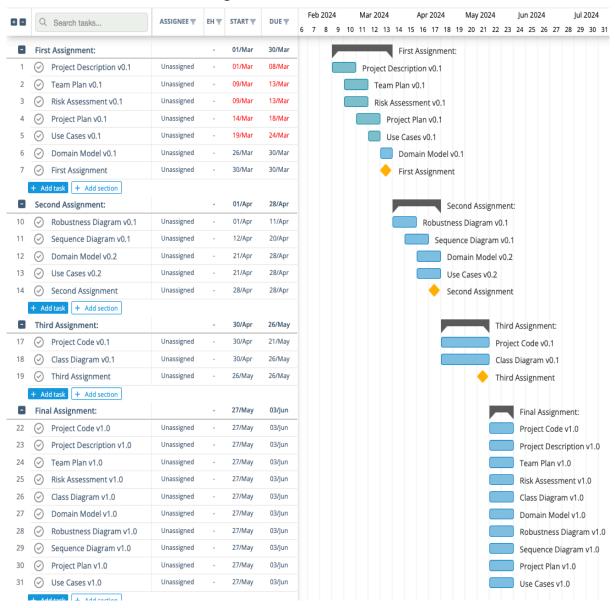

Εικόνα 4.

Τελική απόδοση ομάδας (συμπεράσματα)

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το project, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το πως εξελίχθηκε η εργασία μας πάνω σε αυτό και για τον τρόπο που επιλέξαμε να εργαστούμε.

Αρχικά, συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε εξ αποστάσεως ή από κοντά 2 φορές την εβδομάδα, αλλά αρκετά σύντομα χρειάστηκε να βρισκόμαστε και να επικοινωνούμε πιο συχνά, τουλάχιστον 3 με 4 μερες την εβδομάδα. Πέρα από ομαδικές συναντήσεις, χρειάστηκε να επικοινωνούμε και ανά 2 όταν χωρίσαμε κάποια κομμάτια των παραδοτέων. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι το πρότζεκτ απαιτούσε αρκετό χρόνο, αλλά προσαρμόστηκε όλη η ομάδα γρήγορα στις απαιτήσεις του.

Όλη η ομάδα εργάστηκε ισάξια και το πρότζεκτ μοιράστηκε ισότιμα στα μέλη της ομάδας. Ως ομάδα είχαμε καλή συνεννόηση και συνεργασία. Όλα τα μέλη είμασταν πρόθυμα να βοηθηθούμε ο ένας από τον άλλον, είτε στο πλαίσιο κατανόησης του παραδοτέου είτε στο πλαίσιο διεκπεραίωσης του, οπότε δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερη δυσκολία στην συνεργασία μας ως ομάδα.

Είχαμε επιλέξει να εργαστούμε με την μέθοδο της Kanban. Ακολουθήσαμε όσο το δυνατόν αυτή τη μέθοδο και κυρίως η συνεργασία μας βασίστηκε στην διαφάνεια των εργασιών που εκτελούσε ο καθένας. Τα διαγράμματα (gant, pert) τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές και δεν υπήρχε καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι λειτούργησε η μέθοδος που εργαστήκαμε, αλλά δεν ακολουθήσαμε κατά γράμμα την Kanban. Εργαστήκαμε με ένα δικό μας δυναμικό μοντέλο με αρκετές συναντήσεις και feedback μεταξύ μας, παράλληλα με την παρακολούθηση όλων των μελών σε τι στάδιο βρίσκεται κάθε παραδοτέο.
